

今年度、石岡市で購入したドローンを活用し、
令和2年10月20日に上空から撮影しました。
今後も定期的にドローンを有効活用していきます。

全景



南側から撮影




杭工事が終わり、現在基礎部分の工事を行いました。

イメージ図



基礎鉄筋組立状況

9月下旬から工事が始まり、10月中旬に基礎鉄筋・
型枠が完了しました。

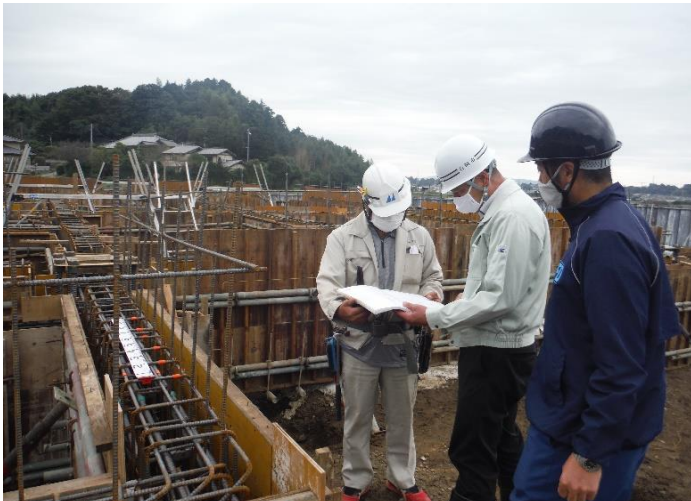

配筋検査

設計通り鉄筋が組まれているか検査をしています。



基礎コンクリート打設状況

10月16日に基礎コンクリート打設を実施しました。
